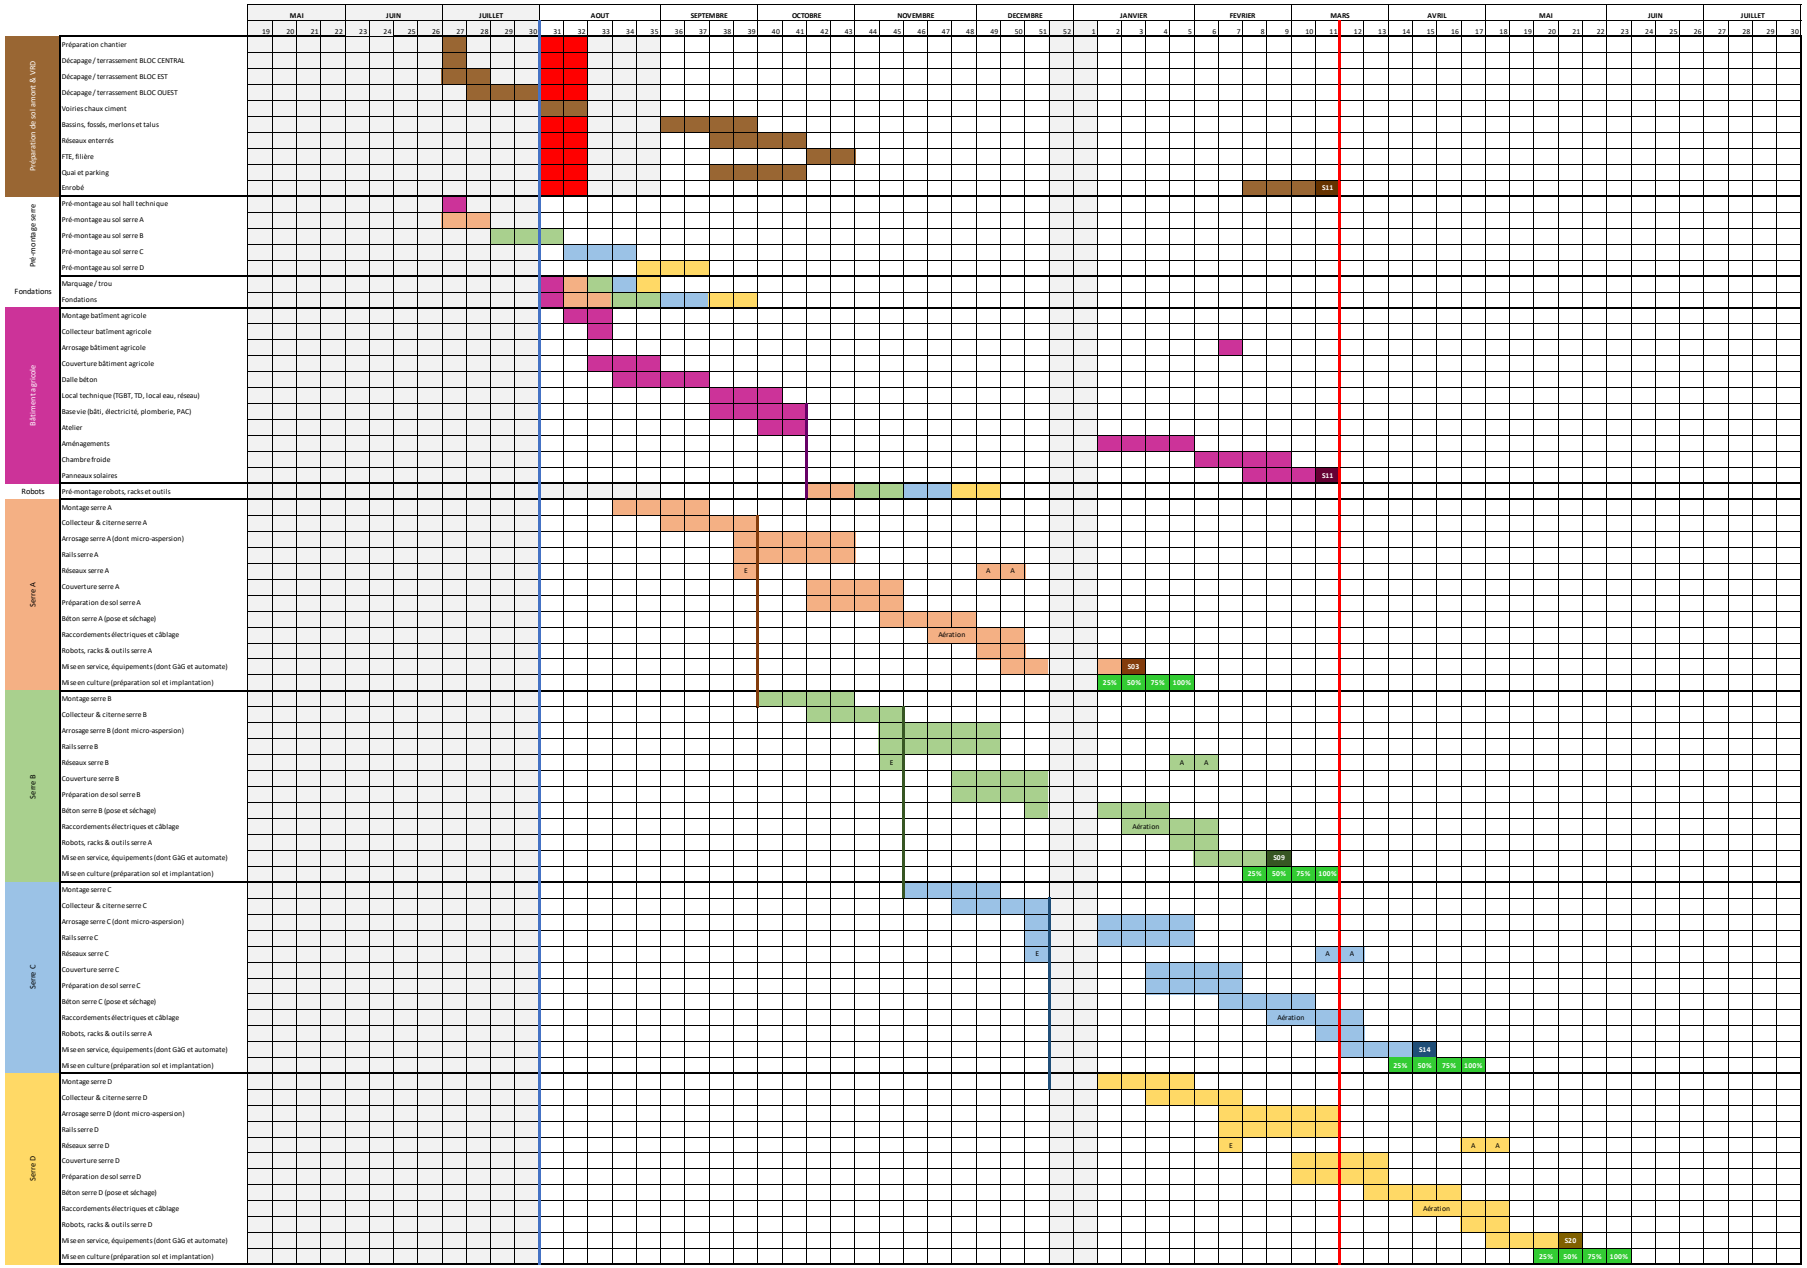
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
Préparation de sol avant & VRD
Préparation chantier
Décapage / terrassement BLOC CENTRAL
Décapage / terrassement BLOC EST
Décapage / terrassement BLOC OUEST
Voiries chaux ciment
Bassins, fossés, merlons et talus
Réseaux enterrés
FTE, filière
Quai et parking
Enrobé
S11
Pré-montage serre
Pré-montage au sol hall technique
Pré-montage au sol serre A
Pré-montage au sol serre B
Pré-montage au sol serre C
Pré-montage au sol serre D
Fondations
Marquage / trou
Fondations
Bâtiments agricole
Montage batiment agricole
Collecteur batiment agricole
Arrosage bâtiment agricole
Couverture bâtiment agricole
Dalle béton
Local technique (TGBT, TD, local eau, réseau)
Base vie (bâti, électricité, plomberie, PAC)
Atelier
Aménagements
Chambre froide
Panneaux solaires
S11
Robots
Pré-montage robots, racks et outils
Serre A
Montage serre A
Collecteur & citerne serre A
Arrosage serre A (dont micro-aspersion)
Rails serre A
Réseaux serre A
E
A
A
Couverture serre A
Préparation de sol serre A
Béton serre A (pose et séchage)
Raccordements électriques et câblage
Aération
Robots, racks & outils serre A
Mise en service, équipements (dont GAG et automate)
S03
Mise en culture (préparation sol et implantation)
25%
50%
75%
100%
Serre B
Montage serre B
Collecteur & citerne serre B
Arrosage serre B (dont micro-aspersion)
Rails serre B
Réseaux serre B
E
A
A
Couverture serre B
Préparation de sol serre B
Béton serre B (pose et séchage)
Raccordements électriques et câblage
Aération
Robots, racks & outils serre A
Mise en service, équipements (dont GAG et automate)
S09
Mise en culture (préparation sol et implantation)
25%
50%
75%
100%
Serre C
Montage serre C
Collecteur & citerne serre C
Arrosage serre C (dont micro-aspersion)
Rails serre C
Réseaux serre C
E
A
A
Couverture serre C
Préparation de sol serre C
Béton serre C (pose et séchage)
Raccordements électriques et câblage
Aération
Robots, racks & outils serre A
Mise en service, équipements (dont GAG et automate)
S14
Mise en culture (préparation sol et implantation)
25%
50%
75%
100%
Serre D
Montage serre D
Collecteur & citerne serre D
Arrosage serre D (dont micro-aspersion)
Rails serre D
Réseaux serre D
E
A
A
Couverture serre D
Préparation de sol serre D
Béton serre D (pose et séchage)
Raccordements électriques et câblage
Aération
Robots, racks & outils serre D
Mise en service, équipements (dont GAG et automate)
S20
Mise en culture (préparation sol et implantation)
25%
50%
75%
100%
